

自主点検の実施事項 説明用資料

エア・ウォーター株式会社

自主点検全体像

● 本資料の目的と自主点検全体像

- 本資料は、連結会社各社が自主点検の目的・趣旨を理解し、具体的なアクションプランを検討・実施する際の参考資料となることを目的として、各自主点検の実施項目における具体的な手続きの例と、求められる成果物のイメージをまとめている
- 本資料に加えて、2026年3月6日にユニット長/子会社向けに実施した説明会の資料「調査結果概況説明会」を改めて配布する。すべての論点を網羅したものではないが、自主点検に取り組む際の参考資料として目を通されたい
- 成果物については、各社の明細データの形式やシステム等が異なることから統一の様式を作成していないため、本資料で示すイメージを参考にして各社の実態に合わせた形式で作成するものとする
- 分析に使用したデータについて第三者による再現性を確保するため、データソース（システム名など）と抽出条件及び手順（SQLなどのクエリやスクリプトを使用した場合はそのコード）の記録も成果物として提出する
- 自主点検の成果物は親会社（サポートチーム含む）が確認し、追加的な質問や資料依頼を予定している
- 自主点検の実施に加えて、あずさ監査法人の監査対応として追加的な手続き、質問、資料依頼には適切に対応することとする

1. 自主点検全体像



26 期経理室 通達第 1 号(2026 年3月27日)において、連結会社全社を対象にして自主点検28項目の実施が求められており、一定の成果物の作成と提出が要請されている

No.	自主点検項目	関連科目
1	売掛金の残高確認	売掛金・売上
2	在庫の実地棚卸	棚卸資産・売上
3	固定資産の実査	固定資産
4	滞留債権のチェック	売上
5	売上マイナスデータ（売上の取消仕訳）のチェック	売上
6	売上・粗利率の月次推移分析	売上
7	収益認識アンケート	売上
8	売上明細データのチェック	売上
9	工事案件の収益認識の会計基準へのあてはめ	売上、売上原価
10	工事案件の実行予算の月次推移分析	売上、売上原価
11	工事案件の購買データや原材料入出庫データの整合性分析	売上、売上原価
12	工事案件の進捗率の月次推移分析	売上、売上原価
13	未成工事支出金の滞留チェック	売上、売上原価
14	工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件の原価振替取引の要因説明	売上原価
15	工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件の粗利率の月次推移分析	売上原価

No.	自主点検項目	関連科目
16	社内/会社間取引の価格設定の妥当性チェック	販管費
17	費用振替取引の要因説明	販管費
18	各費用の月次推移分析	販管費
19	当期に費用計上すべき請求書の有無のチェック	販管費
20	非経常的な事象の確認	販管費
21	見積計上費用の計上根拠整理	販管費
22	固定資産の除却取引のチェック	固定資産
23	修繕費・研究費に基づく資産計上項目のチェック	固定資産
24	資産除去債務の計上要否の判断を証拠に基づいて整理	固定資産
25	減損判定資料の作成及び提出	固定資産
26	賞与引当金の計上根拠資料、支払額比較	引当金
27	自主点検チェックリスト ★	全般
28	財務分析	全般

 : 別途、具体的な手続に関する案内を実施済み/実施予定

★ : 自主点検チェックリストの位置づけは次ページを参照

● No.27自主点検チェックリストについて

- No.27自主点検チェックリストは、No.1-26の点検項目の対応論点をリスト化したものである
- 自主点検項目の対応が完了すれば、チェックリストの自己評価は完了するという関係にある

<自主点検実施項目>


No.	自主点検項目	関連科目	対応論点項目
4	滞留債権のチェック	売上	実態のない売上計上（根拠証拠に基づかない売上計上、本人代理人取引、循環取引など）
5	売上マイナスデータ（売上の取消仕訳）のチェック	売上	
6	売上・粗利の月次推移分析	売上	

<自主点検チェックリスト>

No.	チェック項目	自己評価
1. 実態のない売上計上		
1-1	入金のない売上について、理由を取引単位で確認しているか	Yes / No
1-2	同一取引先・同一金額・短期間で売上計上と取消が発生していないか	Yes / No
1-3	期末前後で売上・粗利が不自然に増減していないか	Yes / No

● No.27自主点検チェックリストについて

- No.27自主点検チェックリストは、各社が適正な財務諸表を作成した、という主張の基礎を為すものとして位置づける
- 半期報告書提出時に各社に要請した宣誓書と強く関連するものであり、自主点検チェックリストの回答にあたっては、各位誠実に回答すること



自主点検項目
の実施



自主点検
チェックリスト
での最終確認




宣誓書
へのサイン

1. 自主点検全体像



● 自主点検の実施とチェックリストの回収スケジュール（見込み）※変動する可能性あり

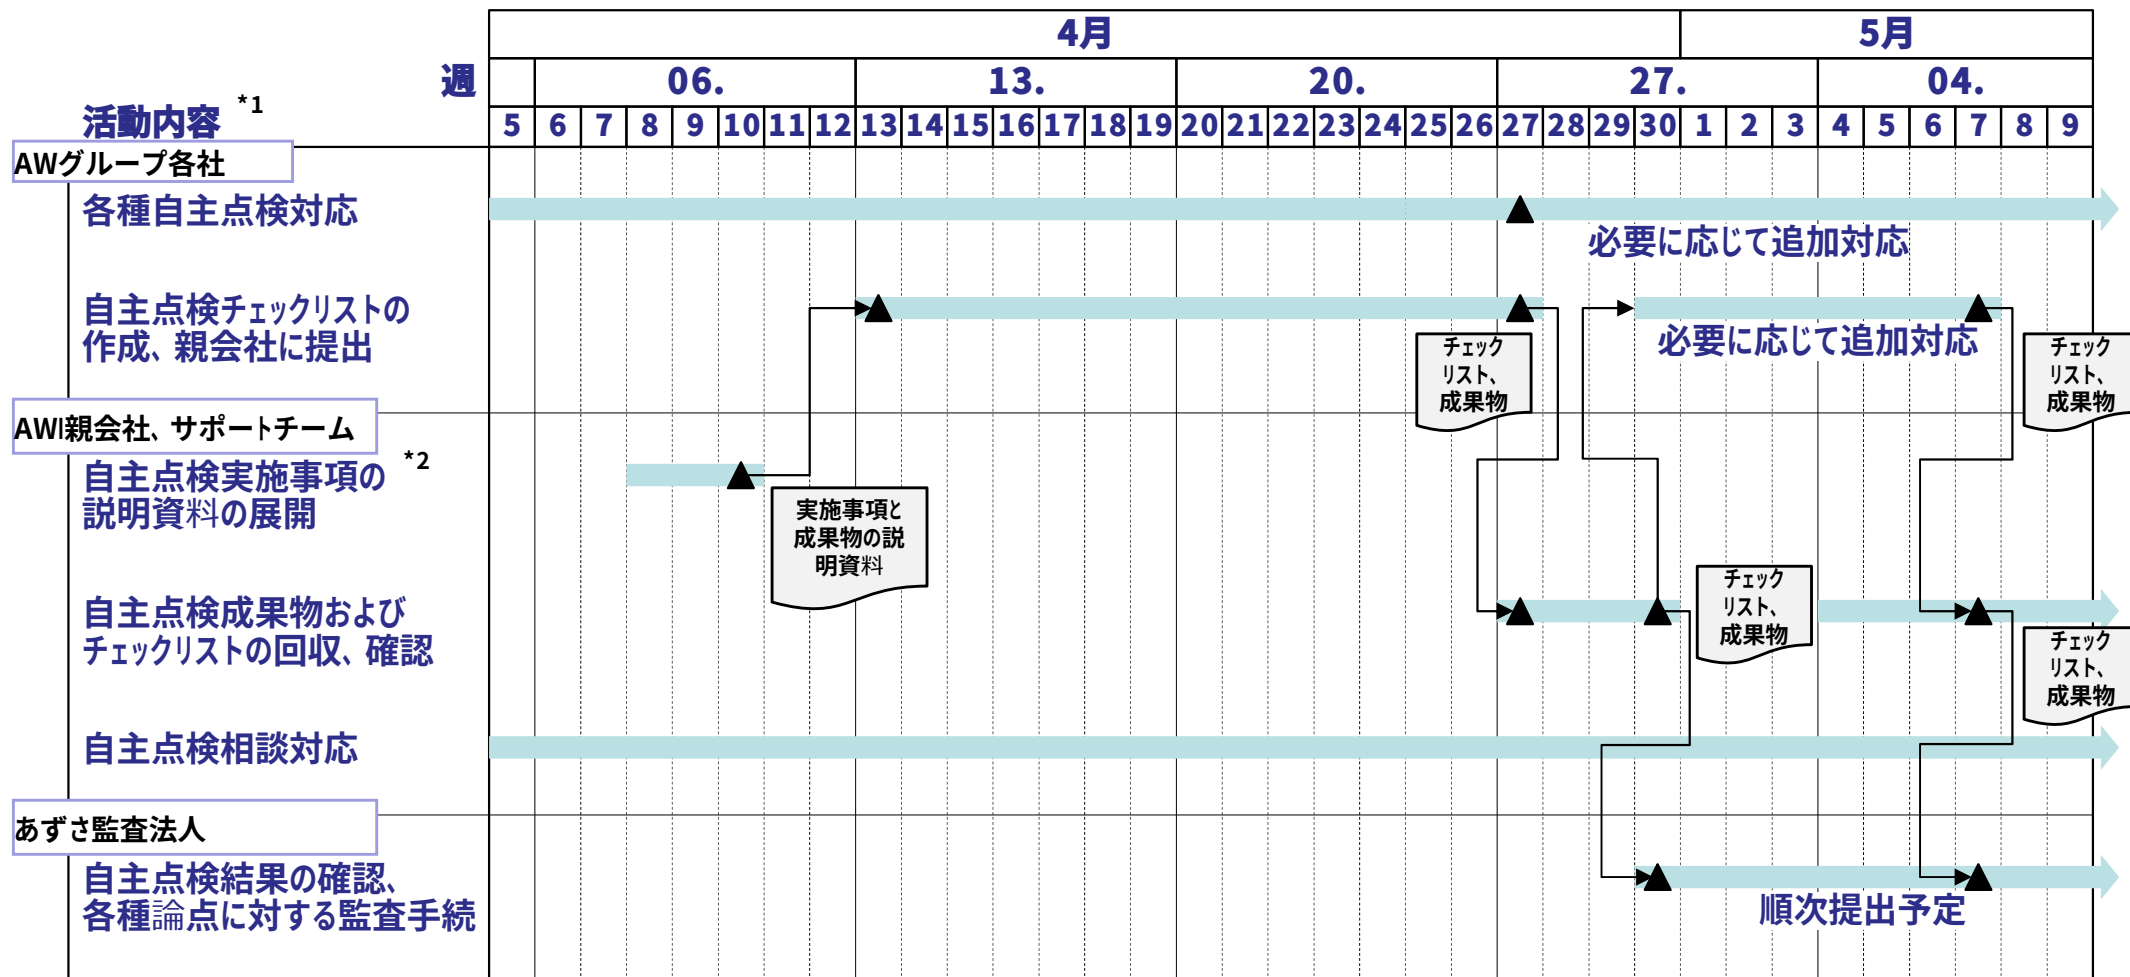

*1：残確・実地棚卸・固定資産実査・部門等の費用付替・資産除去債務・財務分析はそれぞれの説明資料に記載されているスケジュールを参照されたい

*2：自主点検実施事項の説明資料は4/10までに段階的に配信予定

1. 自主点検全体像 – 提出期日



No.	自主点検項目	関連科目	提出期日	No.	自主点検項目	関連科目	提出期日
1	売掛金の残高確認	売掛金・売上		16	社内/会社間取引の価格設定の妥当性 チェック	販管費	
2	在庫の実地棚卸	棚卸資産・売上		17	費用振替取引の要因説明	販管費	
3	固定資産の実査	固定資産		18	各費用の月次推移分析	販管費	4/27
4	滞留債権のチェック	売上	4/27	19	当期に費用計上すべき請求書の有無の チェック	販管費	5/11
5	売上マイナスデータ（売上の取消仕訳） のチェック	売上	4/27、 5/11	20	非経常的な事象の確認	販管費	4/27
6	売上・粗利率の月次推移分析	売上	4/20	21	見積計上費用の計上根拠整理	販管費	4/27
7	収益認識アンケート	売上		22	固定資産の除却取引のチェック	固定資産	4/27
8	売上明細データのチェック	売上	4/27	23	修繕費・研究費に基づく資産計上項目の チェック	固定資産	4/27
9	工事案件の収益認識の会計基準へのあ てはめ	売上、売上原価	4/27	24	資産除去債務の計上要否の判断を証憑 に基づいて整理	固定資産	
10	工事案件の実行予算の月次推移分析	売上、売上原価	4/22	25	減損判定資料の作成及び提出	固定資産	4/27
11	工事案件の購買データや原材料入出庫 データの整合性分析	売上、売上原価	4/27	26	賞与引当金の計上根拠資料、支払額比 較	引当金	4/20
12	工事案件の進捗率の月次推移分析	売上、売上原価	4/22	27	自主点検チェックリスト	全般	4/27、 5/11
13	未成工事支出金の滞留チェック	売上、売上原価	4/22	28	財務分析	全般	
14	工事案件及び工事以外の個別原価計算 適用案件の原価振替取引の要因説明	売上原価	4/27				
15	工事案件及び工事以外の個別原価計算 適用案件の粗利率の月次推移分析	売上原価	4/22				

：別途、具体的なスケジュールを案内済み/案内予定

● 自主点検の成果物とチェックリストの提出方法

<AWグループ各社⇔AW親会社、サポートチーム>

- AWグループ各社で実施した自主点検の成果物とチェックリストは、シェアポイントを通じてAW親会社とサポートチームに提出する

成果物（例）：「No.4滞留債権チェック」の成果物であれば、期末滞留債権一覧（明細の合計と試算表の一致を確認し、回収遅延の理由と最新の回収予定日を記載したもの）等

- AW親会社とサポートチームは自主点検の成果物とチェックリストの内容を確認し、必要に応じてAWグループ各社に対して追加的な質問や手続きを要請する予定である

提出先：[Guest AW協業 \(2026/3/16～\) - ドキュメント - 01_個社別フォルダ \(サポート\) - すべてのドキュメント](#) > 各社用のフォルダ

※シェアポイントにアクセスできない一部の会社は、管理責任部署・管理責任会社へファイルを送付し、管理責任部署・管理責任会社が当該子会社フォルダに格納する

<AWグループ⇔あずさ監査法人>

- AW親会社とサポートチームが内容を確認した自主点検の成果物とチェックリストは、あずさ監査法人の求めに応じて順次提出する
- あずさ監査法人から追加的な質問や資料の提出依頼を求められた場合は誠実に対応する

提出先：協議中のため、確定次第連絡予定

各実施項目の手続き例と成果物イメージ

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
4	滞留債権のチェック	売上	26/3末	実態のない売上計上 （根拠証憑に基づかない売上計上、本人代理人取引、循環取引など）	全社	1-1 入金のない売上について、理由を取引単位で確認している
5	売上マイナスデータ（売上の取消仕訳）のチェック	売上	25/4月-26/3月 +26/4月			1-2 同一取引先・同一金額・短期間での売上計上と取消が発生していないか
6	売上・粗利の月次推移分析	売上	25/4月-26/3月			1-3 期末前後で売上・粗利が不自然に増減していないか

● (No.4) 滞留債権のチェック

① 確認方法（作業イメージ）

1. 期末の売掛金明細を出力し、明細の合計と試算表の残高が一致していることを確かめる
2. 売掛金明細の内、回収予定日を過ぎている売掛金（滞留債権）について回収が遅延している理由を確認する。回収遅延理由については部門責任者等の適切な承認者の承認を得る
3. 回収遅延に合理的な理由がない売掛金については、当該売掛金を計上することとなった売上取引の根拠証憑（数量、単価、計上日の3点が確認できる根拠を具備しているもの）を確認し、売上計上の妥当性を確かめる
4. 滞留債権を一覧化し、債権の発生日、回収遅延の理由、最新の回収予定日を記載したリスト（期末滞留債権一覧）を作成する

② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 期末滞留債権一覧（回収遅延の理由と最新の回収予定日を記載したもの）

成果物イメージ
は次ページ参照



<No.4 成果物イメージ>

- (No.4) 滞留債権のチェック
 - 1. 期末滞留債権一覧（回収遅延の理由と最新の回収予定日を記載したもの）

単位：百万円

売掛金明細				追記箇所						
取引先コード	取引先名	繰越残高	残高	通常回収サイト	取引発生日	回収予定日	滞留	最新の回収予定日	回収遅延理由（合理的でない場合、売上の妥当性をコメント）	
1	A社	100	100	2か月	2025/10/3	2025/12/31	○	2026/5/31	取引No.1001に係る債権が滞留している。回収遅延理由は、先方の指定書式での必須提出書類の漏れにより請求ができていなかったためである。なお、当該理由については部門責任者の承認を得ている。この点、対象取引の契約書、注文書、納品書にて、取引発生日や取引金額の一致を確認し、売上計上の妥当性に問題はないと判断した。	
2	B社	200	200	4か月	2025/12/14	2026/4/30				
3	C社	100	100	3か月	2026/1/25	2026/4/30				
4	D社	500	500	1か月	2026/2/27	2026/3/31	○	2026/4/30	取引No.1023に係る債権が滞留している。回収遅延理由は月末付近の取引であったことから請求書の到着が遅延したためである。なお、当該理由については部門責任者の承認を得ている。この点、既に請求書を発送しており、4/30に回収予定であることから問題ないと判断した。	
5	E社	0	90	3か月	2026/3/24	2026/6/30				
		合計	990							
		試算表金額	990							
		差異	0							

<ポイント>

- ・ 回収遅延理由は部門責任者の承認を得る
- ・ 回収遅延理由が合理的でない場合は、対象取引に係る契約書、注文書、納品書(又は作業完了報告書)等の外部証憑を確認し、売上の妥当性を確かめる

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
4	滞留債権のチェック	売上	26/3末	実態のない売上計上 （根拠証憑に基づかない売上計上、本人代理人取引、循環取引など）	全社	1-1 入金のない売上について、理由を取引単位で確認している
5	売上マイナスデータ（売上の取消仕訳）のチェック	売上	25/4月-26/3月 +26/4月（※）			1-2 同一取引先・同一金額・短期間での売上計上と取消が発生していないか
6	売上・粗利の月次推移分析	売上	25/4月-26/3月			1-3 期末前後で売上・粗利が不自然に増減していないか

●（No.5）売上マイナスデータ（売上の取消仕訳）のチェック

① 確認方法（作業イメージ）

1. 年間（2025年4月～2026年3月）の取引データを出力し、取引データの合計と試算表の売上高が一致していることを確かめる（※2026年4月のデータの確認は5月以降に実施する）
2. 取引データを取引先別・案件別にソートし、同一の取引先・案件に対して売上の計上とマイナス処理が繰り返されていないかを確かめる
3. 該当の取引が検出された場合、根拠資料（数量、単価、計上日の3点が確認できる根拠を具備しているもの）を確認し、売上計上が適切であったかを確認する

成果物イメージ
は次ページ参照

② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 年間の取引データ（取引別先・案件別にソートし、売上のマイナス処理があった場合には、理由を記載したもの）※2026年3月までのデータチェックが完了したら成果物を一次提出し、2026年4月のデータチェックは5月以降に実施した上で成果物を二次提出する

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<No.5 成果物イメージ>

● (No. 5) 売上マイナスデータ（売上の取消仕訳）のチェック

1. 年間の取引データ（取引別先・案件別にソートし、売上のマイナス処理があった場合には、理由を記載したもの）※2026年3月までのデータチェックが完了したら成果物を一次提出し、2026年4月のデータチェックは5月以降に実施した上で成果物を二次提出する

取引先名	案件名	伝票番号	計上日	売上金額	検証コメント	会計処理の顛末
Tフーズ株式会社	冷凍倉庫監視システム	SL2510-0400	2025/10/25	18,000,000		
V商事株式会社	サーバーラック 10台	SL2511-0300	2025/11/10	5,000,000	計上から5日後に一部金額が取り消されている。調査の結果、納品した10台のうち2台に輸送中の破損があり、顧客検収時に返品されたことが判明。返品受入報告書および顧客との協議メールを確認	破損した2台分（1,000,000円）の売上を11/15付で取り消す修正仕訳（No. SL2511-0350）を起票。事業上合理的な取引と判断
V商事株式会社	サーバーラック 10台	SL2511-0350	2025/11/15	-1,000,000	（上記 SL2511-0300 の一部取消仕訳）	（同上）
V商事株式会社	ソフトウェアライセンス	SL2602-0150	2026/2/20	7,500,000		
W建設株式会社	建設資材（セメント）納品	SL2601-0880	2026/1/30	23,000,000		
Y工業株式会社	プラント保守部品	SL2512-0480	2025/12/15	8,000,000	計上から5日後に全額が取り消されている。顧客Y工業への確認および返品受入報告書の照合により、「納品部品の仕様違いによる返品」であることが確認された	顧客との合意に基づき、12/20付で売上取消の修正仕訳（No. SL2512-0511）を起票。代替品は翌月に納品・売上計上済みであり、事業上合理的な取引と判断
Y工業株式会社	プラント保守部品	SL2512-0511	2025/12/20	-8,000,000	（上記 SL2512-0480 の取消仕訳）	（同上）
Y工業株式会社	プラント保守部品	SL2601-0151	2026/1/25	8,000,000	（上記 SL2512-0480 の再計上）	（同上）
株式会社Z	システム保守サービス	SL2509-0210	2025/9/15	12,000,000		

<分析上のポイント>

- 根拠資料は、①当初の売上計上が妥当であったことを示す資料と②その後の取消処理が妥当であることを示す資料であること確認する
 - ①の例：注文書、納品書・検収書の控え、発送伝票など
 - ②の例：顧客発行の返品依頼書、不具合報告書、顧客との協議議事録・メール、再発行した請求書など

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
4	滞留債権のチェック	売上	26/3末	実態のない売上計上 （根拠証憑に基づかない売上計上、本人代理人取引、循環取引など）	全社	1-1 入金のない売上について、理由を取引単位で確認している
5	売上マイナスデータ（売上の取消仕訳）のチェック	売上	25/4月-26/3月 +26/4月			1-2 同一取引先・同一金額・短期間での売上計上と取消が発生していないか
6	売上・粗利の月次推移分析	売上	25/4月-26/3月			1-3 期末前後で売上・粗利が不自然に増減していないか

●（No.6）売上・粗利の月次推移分析

① 確認方法（作業イメージ）

1. 月次（2025年4月～2026年3月の月次）の売上・粗利データを出力し、月次資料の合計と試算表の売上・粗利の金額が一致していることを確かめる（一致しない場合はその理由を記載する）
2. 売上・粗利の推移をグラフ化（26/3月期と25/3月期）し、増減分析のコメントを記載する
3. 特に四半期末月に上昇傾向があった場合には、具体的な案件情報に基づいて増減要因のコメントを記載するとともに、売上計上の根拠資料（契約書/注文書・請求書、納品書、検収書、送り状等の数量、単価、計上日の3点が確認できる根拠を具備しているもの）と売上明細を照合し、売上計上の妥当性を検証する


② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 月次の売上・粗利の推移データ（推移をグラフ化し、増減分析コメントを付したもの）

成果物イメージ
は次ページ参照

<No.6 成果物イメージ>

- (No.6) 売上・粗利の月次推移分析
 - 1. 月次の売上・粗利の推移データ（推移をグラフ化し、増減分析コメントを付したもの）

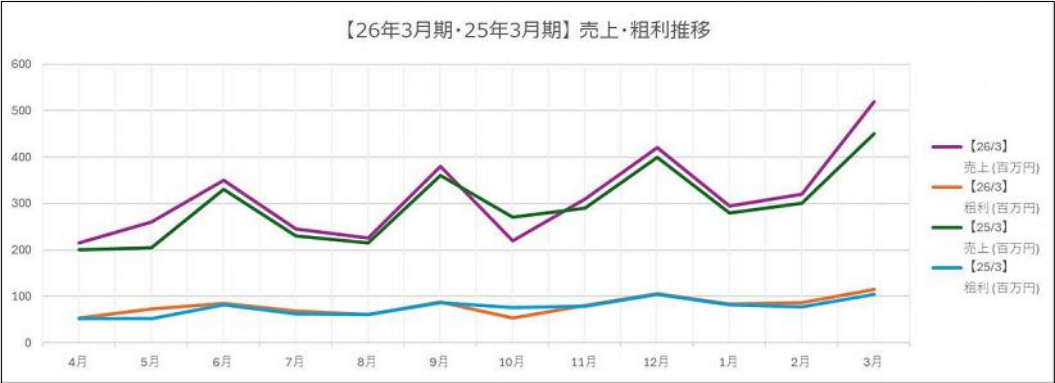

- <分析上のポイント>
- 増減コメントには要因毎の影響金額を記載する
 - 増減コメントは月次推移だけでなく、前期との比較の観点でも記載する（同じトレンドであればその旨を記載）
 - 主な増減要因は根拠証憑を整理する（提出が要請される可能性あり）
 - 前年同期・前月比較ともに、**10百万円の変動、かつ、20%以上の変動**があれば増減コメントを記載する

月	[26/3] 売上 (百万円)	[26/3] 粗利 (百万円)	[25/3] 売上 (百万円)	[25/3] 粗利 (百万円)	売上前月比	粗利前月比	売上前年 同月比	粗利前年 同月比	増減分析コメント
4月	215	53.8	200	52	-	-	108%	103%	
5月	260	72.8	205	51.3	121%	135%	127%	142%	・[前年比/前月比] 4月に発表した高付加価値の新製品『△△』の初回ロット出荷が集中し、売上・粗利率ともに大きく伸長（+50M）
6月	350	84	330	82.5	135%	115%	106%	102%	・[前月比] 主要代理店からの四半期末発注（駆け込み需要）が集中（+85M） ・前年同様のトレンド
7月	245	68.6	230	62.1	70%	82%	107%	110%	・前年同様のトレンド
8月	225	60.8	215	60.2	92%	89%	105%	101%	
9月	380	87.4	360	86.4	169%	144%	106%	101%	・[前月比] 大口顧客A社向けプラント設備の中間納品が計画通り行われ、売上が増加（+150M）
10月	220	52.8	270	75.6	58%	60%	81%	70%	・[前年比/前月比] 半導体部品のサプライヤーからの納入が世界的に遅延した影響で、主力製品『○△』の生産が滞り、出荷が一部翌月以降にずれ込み（-15M）
11月	310	80.6	290	78.3	141%	153%	107%	103%	・[前月比] 前月の部品供給遅延による生産遅延が解消し、10月からの繰り越し分を含めて出荷が回復（+80M）
12月	420	105	400	104	135%	130%	105%	101%	・[前月比] 年末商戦向けの民生用製品の出荷がピークに達した（+180M） ・前年同様のトレンド
1月	295	82.6	280	81.2	70%	79%	105%	102%	・前年同様のトレンド
2月	320	86.4	300	78	108%	105%	107%	111%	
3月	520	114.4	450	103.5	163%	132%	116%	111%	・[前年比/前月比] 年度末予算消化に伴う官公庁向けの大型インフラ案件の検収が完了（+280M）

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
8	売上明細データのチェック	売上	26/3月単月	検収未完了や分割検収による売上の前倒し計上、既完了案件の売上の後倒し計上	全社	3-2 検収基準が曖昧な取引が存在していないか

● (No.8) 売上明細データのチェック

① 確認方法（作業イメージ）

1. 期末月（2026年3月単月）の売上明細を出力し、明細の合計と試算表の3月単月の売上高が一致していることを確かめる
2. 売上明細単位で、適切な外部根拠資料（数量、単価、計上日の3点が確認できる根拠を具備しているもの）に基づいた収益認識が行われていることを確かめ、コメントを記載する
3. 適切な外部根拠資料が存在しない売上については、売上計上の可否を慎重に検討し、必要に応じて修正を行う

② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 売上明細データ（検証結果コメントを付したもの）
2. 収益認識の根拠となる資料（ただし、提出対象は10百万円以上の取引に限る）

成果物イメージ
は次ページ参照



<No.8 成果物イメージ>

● (No.8) 売上明細データのチェック
1. 売上明細データ

伝票No.	計上日	顧客名	案件名	売上金額 (円)	検証結果	会計処理の顛末	修正した場合は伝票Noを記載
SL2603-0815	2026/3/25	A工業株式会社	標準ポンプユニット XYZ-100	15,000,000	顧客A工業の署名・捺印がある検収書（日付：2026/3/25）の原本を確認。契約上の履行義務が期末日までに完了し、顧客への支配が移転していることが客観的に証明されている		
SL2603-0816	2026/3/28	株式会社B商事	基幹システム導入プロジェクト	80,000,000	契約書に定められた検収条件に基づき、顧客B商事のプロジェクト責任者による署名済みのプロジェクト完了報告書（日付：2026/3/28）を確認。履行義務の完了と支配の移転が確認できる		
SL2603-0817	2026/3/31	Cエレクトロニクス	半導体製造装置 モデルS	120,000,000	客観的な外部証拠が存在しないため顧客C社へ直接確認したところ、正式な検収日は2026年4月5日であることが判明。支配の移転は4月であり、3月の売上計上は前倒し計上に該当する	当月の売上計上を取り消し、翌期（4月）に計上するための修正仕訳を起票した	SL2604-0312
SL2603-0818	2026/3/31	D建設株式会社	現場監視システム（1台）	30,000	D建設の署名・捺印がある検収書（日付：2026/4/2）の原本を確認。検収基準で計上すべきところ出荷基準（出荷日：2026/3/31）で計上しており、収益認識要件を満たさないため、当月の売上計上は前倒し計上となる	金額的重要性が低いため修正は行わない	
SL2603-0819	2026/3/31	株式会社Eデザイン	Webサイト構築（フェーズ1/2）	30,000,000	契約書を確認したところ、収益認識は「全フェーズ完了後の最終検収時」と規定されている。フェーズ1のみの完了では収益認識要件を満たさないため、分割検収が認められない契約であるため、当月の売上計上は前倒し計上となる	当月の売上計上を取り消す。最終検収が完了するまで、発生原価は未成工事支出金等で処理し、売上は計上しない	SL2604-0315

2. 収益認識の根拠となる資料（ただし、提出対象は10百万円以上の取引に限る）

<根拠資料のポイント>

- 顧客や第三者といった外部の当事者によって作成または承認されている
- 具体的な内容（製品名、サービス名、数量）が記載されている
- 顧客が製品・サービスを物理的に受領、または実質的に利用可能な状態にあったことを示している

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
9	工事案件の収益認識の会計基準へのあてはめ	売上、売上原価	25/4月-26/3月	工事進行基準、未成工事の不正	別途親会社が指定する会社	5-1 工事進行基準の適用可否を取引ごとに判断しているか
10	工事案件の実行予算の月次推移分析					5-2 実行予算を適切に見積ることができるか
11	工事案件の購買データや原材料入出庫データの整合性分析					5-3 実際発生原価（材料費）は、購買データ及び原材料入出庫データと紐づいているか
12	工事案件の進捗率の月次推移分析					5-5 進捗率の算定根拠資料は適切に整備されているか
13	未成工事支出金の滞留チェック		26/3末			5-4 実際発生原価（経費）は、適切な根拠資料に基づき計上されているか 5-6 未成工事残高に長期滞留している案件がないか

<自主点検実施項目No.9-13の手続対象会社：以下14社>

#	会社コード	会社名	#	会社コード	会社名
1	B07401	AW産業医療ガス	8	B53702	TOMCO2
2	B13401	AW東日本	9	B53705	TWA
3	B22301	AWエンジニアリング	10	B53706	AWGS
4	B24901	AW防災	11	B53901	パワーパートナーズ
5	B31201	AW西日本	12	B54901	松尾HD
6	B50301	アクアインテック	13	B55401	HITEC
7	B52901	グローバルワイド	14	B57801	ホクエイ

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
9	工事案件の収益認識の会計基準へのあてはめ	売上、売上原価	25/4月-26/3月	工事進行基準、未成工事の不正	別途親会社が指定する会社	5-1 工事進行基準の適用可否を取引ごとに判断しているか
10	工事案件の実行予算の月次推移分析					5-2 実行予算を適切に見積ることができるか
11	工事案件の購買データや原材料入出庫データの整合性分析					5-3 実際発生原価（材料費）は、購買データ及び原材料入出庫データと紐づいているか
12	工事案件の進捗率の月次推移分析					5-5 進捗率の算定根拠資料は適切に整備されているか
13	未成工事支出金の滞留チェック		26/3末			5-4 実際発生原価（経費）は、適切な根拠資料に基づき計上されているか 5-6 未成工事残高に長期滞留している案件がないか

●（No.9）工事案件の収益認識の会計基準へのあてはめ

① 確認方法（作業イメージ）

- 2026/3期年間（2025年4月～2026年3月）において、進行基準による売上高が計上されている案件（期末時点で完成している案件を含む）をリスト化する
- リスト化した進行基準適用案件について、履行義務毎に会計基準（およびAWグループ会計方針）の定めにしたがって、**進行基準適用の妥当性**を確かめる
- 進行基準適用案件について一時点での収益認識が妥当となった場合、適切に修正する

② 親会社（AWI）に提出する成果物

- 進行基準適用案件リスト（履行義務毎の収益認識方法の適切性を検討したことが分かる資料。収益認識方法が妥当と判断した根拠を記載する）

成果物イメージ
は次ページ参照

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<No.9 成果物イメージ>

<分析上のポイント>

- ・ AWグループ会計方針にしたがって検討できているかを確認する

● (No.9) 工事案件の収益認識の会計基準へのあてはめ

1. 進行基準適用案件リスト（履行義務毎の収益認識方法の適切性を検討したことが分かる資料。収益認識方法が妥当と判断した根拠を明記する）

<一定の期間にわたり充足される履行義務（進行基準）に該当する条件>

判定基準①

顧客が、当社による財・サービスの移転によって提供される便益を、移転と同時に受け取って消費する
（サービスの提供と同時に、お客様がその効果を使っているか？）

<例>システムの年間保守、月額制のコンサルティング契約

判定基準②

当社による財・サービスの移転が、資産（例えば、仕掛品）を創出するかまたは増価させ、顧客が当該資産の創出または増価につれてそれを支配する。
（お客様の持ち物の価値を高める仕事か？）

<例>お客様の土地に建物を建てる、お客様のビルを改修する

判定基準③

当社による財・サービスの移転は、他に転用できる資産を創出せず、かつ、当社が現在までに完了した財・サービスの移転に対する支払を受ける権利を有しており、契約を約束通り履行する予定である
（他には売れない特注品で、かつ途中解約でもお金をもらえる権利があるか？）

<例>お客様の工場ライン専用の特殊な製造装置、契約書で途中解約時の費用請求について記載がある

案件/管理 No.	案件名	請負額 (百万円)	利益額 (百万円)	開始時期	完成予定	進捗率	26年3月期の 売上計上額 (百万円)	収益認識の判断根拠
PJT-001	A社 新社屋建設工事	3,000	600	2024/7/1	2026/6/1	40%	1,200	[判定条件②に該当] お客様（A社）が所有する土地の上に建物を建設する工事であり、工事が進むにつれてお客様の資産価値が直接的に高まるため
PJT-002	B駅前ビル リニューアル工事	1,200	240	2025/1/1	2025/12/1	20%	240	[判定条件②に該当] お客様がすでに所有しているビルに対して行う改修工事。当社の作業が、そのままお客様の資産価値の向上に繋がるため
PJT-003	C電力向け 特注変電設備の製造	900	180	2024/8/1	2025/7/1	70%	630	[判定条件③に該当] 本設備はC電力専用の特殊な仕様で他社には売れない（特注品）、かつ契約書で途中解約時もそれまでの費用と利益を請求できる権利が保証されているため
PJT-004	D空港 手荷物システムの保守・運用	100	30	2024/4/1	2025/3/1	100%	100	[判定条件①に該当] システムの安定稼働というサービスを年間を通じて提供し、お客様はその「いつでも使える」という恩恵を常に受け続けているため
PJT-005	E製薬工場 クリーンルーム設置	450	90	2024/11/1	2025/8/1	45%	202.5	[判定条件②に該当] お客様が所有する既存の工場内に、特殊な設備（クリーンルーム）を設置する工事であり、お客様の資産の価値を高める作業であるため

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
9	工事案件の収益認識の会計基準へのあてはめ	売上、売上原価	25/4月-26/3月	工事進行基準、未成工事の不正	別途親会社が指定する会社	5-1 工事進行基準の適用可否を取引ごとに判断しているか
10	工事案件の実行予算の月次推移分析					5-2 実行予算を適切に見積ることができるか
11	工事案件の購買データや原材料入出庫データの整合性分析					5-3 実際発生原価（材料費）は、購買データ及び原材料入出庫データと紐づいているか
12	工事案件の進捗率の月次推移分析					5-5 進捗率の算定根拠資料は適切に整備されているか
13	未成工事支出金の滞留チェック		26/3末			5-4 実際発生原価（経費）は、適切な根拠資料に基づき計上されているか 5-6 未成工事残高に長期滞留している案件がないか

● (No.10) 工事案件の実行予算の月次推移分析

① 確認方法（作業イメージ）

- 2026/3期年間（2025年4月～2026年3月）において、進行基準による売上高が計上されている案件（期末時点で完成している案件を含む）をリスト化する
- リスト化した進行基準適用案件について、実行予算の月次推移表（2025年4月～2026年3月）を作成し、著しい増減があった場合には増減要因をコメントする
- 実行予算の変動要因が予算の見積もりが困難な状況を示している場合は進行基準の適用可否を慎重に判断し、一時点での収益認識が妥当となった場合、適切に修正する

② 親会社（AWI）に提出する成果物

- 進行基準適用案件毎の実行予算金額の月次推移データ（推移をグラフ化し、増減分析コメントを付したもの）

成果物イメージ
は次ページ参照

<No.10 成果物イメージ>

- (No.10) 工事案件の実行予算の月次推移分析
 - 1. 進行基準適用案件毎の実行予算金額の月次推移データ（推移をグラフ化し、増減分析コメントを付したもの）

<実行予算の信頼性が低い（進捗度の合理的な測定が困難）と判断される可能性がある状況例>

見積もりの基礎となる情報が不確定な場合

- ・仕様の不確定性：顧客との間で設計や主要な使用が固まっていない、基本設計のみで契約し詳細設計は工事を進めながら行う
- ・工期の不確定性：用地取得の見通しが立っておらず、着工・竣工時期が大きく変動するリスクがある
- ・積算根拠の欠如：担当者の経験則にだけ依存しており、設計図書や下請け業者からの見積書といった客観的な裏付け資料が不足している

過去の実績からみて、見積もり精度に懸念がある場合

- ・類似案件での失敗経験：過去の類似案件において、大幅な予算超過が繰り返し発生している



年月	実行予算額 (百万円)	前月比増減 (百万円)	増減コメント
2025年3月	2,400	-	(期首時点の当初実行予算)
2025年4月	2,400	0	
2025年5月	2,400	0	
2025年6月	2,400	0	
2025年7月	2,405	5	(軽微な仕様変更による増額)
2025年8月	2,480	75	・地質調査の結果、想定外の軟弱地盤が判明し、追加の杭基礎工事が必要となったため (+50M) ・鉄骨資材の仕入価格が、市況高騰の影響により当初見積もりを上回ったため (+25M)
2025年9月	2,480	0	
2025年10月	2,480	0	
2025年11月	2,480	0	
2025年12月	2,440	-40	・内装材の一部を同等性能の代替品へ変更する提案が顧客に承認され、内装工事費が削減されたため (-30M) ・空調設備業者との価格交渉の結果、発注額が当初見積もりを下回ったため (-10M)
2026年1月	2,440	0	
2026年2月	2,445	5	(追加電気工事発生による増額)
2026年3月	2,445	0	(期末時点の確定見込)

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連

<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
9	工事案件の収益認識の会計基準へのあてはめ	売上、売上原価	25/4月-26/3月	工事進行基準、未成工事の不正	別途親会社が指定する会社	5-1 工事進行基準の適用可否を取引ごとに判断しているか
10	工事案件の実行予算の月次推移分析					5-2 実行予算を適切に見積ることができるか
11	工事案件の購買データや原材料入出庫データの整合性分析					5-3 実際発生原価（材料費）は、購買データ及び原材料入出庫データと紐づいているか
12	工事案件の進捗率の月次推移分析					5-5 進捗率の算定根拠資料は適切に整備されているか
13	未成工事支出金の滞留チェック		26/3末			5-4 実際発生原価（経費）は、適切な根拠資料に基づき計上されているか 5-6 未成工事残高に長期滞留している案件がないか

●（No.11）工事案件の購買データや原材料入出庫データの整合性分析

① 確認方法（作業イメージ）

1. 工事案件について、年間（2025年4月～2026年3月）の原材料購買データ、原材料入出庫データ、原価明細データを出力する（対象は、2026/3期年間において、進行基準による売上高が計上されている案件とする（期末時点で完成している案件を含む））
2. 原材料購買データが原材料入庫データと整合していることを確かめる（月次の金額に差がないか）
3. 工事案件の原価明細が原材料出庫データと整合していることを確かめる
4. 原材料入出庫データ（モノの動き）と整合しない購買データや原価明細がある場合、当該取引が実際に行われたことを確認するため、適切な外部根拠証憑を整理し、コメントを記載する

② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 原材料購買データと原材料入庫データの月次比較表
2. 工事案件の原価明細をベースにどの原材料出庫データと紐づくかを記載したもの

成果物イメージ
は次ページ参照



<No.11 成果物イメージ>

- (No.11) 工事案件の購買データや原材料入出庫データの整合性分析
- 1. 原材料購買データと原材料入庫データの月次比較表

原材料購買データ		入庫データ	差額(百万円)	差額の主な理由
対象年月	購買金額(百万円)	入庫金額(百万円)		
2025年4月	100	90	10	月末発注分(納品書No. XXXX)の検収が翌月になったため
2025年5月	120	125	-5	前月からの繰越分(+10M)が入庫した一方、当月も新たに月末発注分の未検収(+5M)が発生
2025年6月	80	85	-5	前月(5月)からの未検収分(+5M)が当月に入庫されたため当月の未検収は発生なし
2025年7月	150	130	20	大型案件(PJT-XXX)向け鋼材の先行発注納品は8月予定
2025年8月	110	125	-15	7月発注の鋼材(+20M)が入庫した一方、当月の月末発注分で未検収(+5M)が発生
2025年9月	130	125	5	前月からの繰越分(+5M)が入庫した一方、当月も新たに月末発注分の未検収(+10M)が発生
2025年10月	90	100	-10	前月からの繰越分(+10M)が当月に入庫されたため、当月の未検収は発生なし
2025年11月	110	100	10	一部資材の品質不良による受入拒否・返品処理(+5M)、月末発注分の未検収(+5M)
2025年12月	60	65	-5	前月からの繰越分(+10M)の一部(+5M)が入庫、年末のため追加発注なし
2026年1月	70	75	-5	前月からの繰越分(+5M)が当月に入庫されたため当月の未検収は発生なし
2026年2月	140	135	5	期末工事向け資材の月末発注分検収は3月予定
2026年3月	50	55	-5	前月からの繰越分(+5M)が当月に入庫されたため
年間合計	1,210	1,210	0	期末時点で発注済み・未入庫(未検収)の残高はなし

- 2. 工事案件の原価明細をベースにどの原材料出庫データと紐づくかを記載したもの(工事案件毎にシートを分けて作成)

<分析上のポイント>

- 原価と出庫(モノの流れ)が対応していることを確認する
- 複数伝票にまたがるケースがあることに注意する

PJT-001PJT-002PJT-003+

原価明細				原材料出庫データ			金額整合性	差額の理由
原価伝票No.	原価計上日	品目名	計上金額	出庫伝票No.	出庫日	出庫金額		
GEN-2508-015	2025/8/10	鉄骨フレームA	5,000,000	SHU-2508-012	2025/8/9	5,000,000	OK	
GEN-2508-016	2025/8/15	高強度コンクリート	1,200,000	SHU-2508-018	2025/8/14	1,199,850	差額あり	原価計算時の標準単価と、出庫時の移動平均単価との差異(-150円)
GEN-2509-021	2025/9/5	配線ケーブルB	800,000	SHU-2509-011	2025/9/4	500,000	OK	1つの原価伝票に対し、出庫が2回に分割されている
GEN-2509-022	2025/9/20	特殊ガラスC	2,500,000	SHU-2509-015	2025/9/6	300,000	OK	
				SHU-2509-031	2025/9/19	2,500,000	OK	

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
9	工事案件の収益認識の会計基準へのあてはめ	売上、売上原価	25/4月-26/3月	工事進行基準、未成工事の不正	別途親会社が指定する会社	5-1 工事進行基準の適用可否を取引ごとに判断しているか
10	工事案件の実行予算の月次推移分析					5-2 実行予算を適切に見積ることができるか
11	工事案件の購買データや原材料入出庫データの整合性分析					5-3 実際発生原価（材料費）は、購買データ及び原材料入出庫データと紐づいているか
12	工事案件の進捗率の月次推移分析					5-5 進捗率の算定根拠資料は適切に整備されているか
13	未成工事支出金の滞留チェック		26/3末			5-4 実際発生原価（経費）は、適切な根拠資料に基づき計上されているか 5-6 未成工事残高に長期滞留している案件がないか

● (No.12) 工事案件の進捗率の月次推移分析

① 確認方法（作業イメージ）

- 2026/3期年間（2025年4月～2026年3月）において、進行基準による売上高が計上されている案件（期末時点で完成している案件を含む）をリスト化する
- リスト化した進行基準適用案件について、進捗率の月次推移表（2025年4月～2026年3月）を作成し、著しい進捗や進捗率のマイナス等があった場合には要因をコメントする
- 各案件の月次の進捗率が適切な根拠資料に基づいて算定されていることを確認する

② 親会社（AWI）に提出する成果物

- 進行基準適用案件毎の進捗率の月次推移表（著しい進捗や進捗率のマイナス等は理由をコメントしたもの）
- 進行基準適用案件毎の進捗率の算定根拠資料

成果物イメージ
は次ページ参照

<No.12 成果物イメージ>

- (No.12) 工事案件の進捗率の月次推移分析
 - 1. 進行基準適用案件毎の進捗率の月次推移表（著しい進捗や進捗率のマイナス等は理由をコメントしたもの）

PJT-001 PJT-002 PJT-003 + (工事案件毎にシートを分けて作成)



年月	実行予算 (百万円)	実際発生原価 (月次) (百万円)	実際発生原価 (累積) (百万円)	進捗率 (月次)	進捗率 (累積)	変動要因コメント
2025年3月	2,400	-	240	-	10.00%	(前期からの繰越)
2025年4月	2,400	70	310	2.90%	12.90%	
2025年5月	2,400	90	400	3.80%	16.70%	
2025年6月	2,400	120	520	5.00%	21.70%	
2025年7月	2,400	100	620	4.10%	25.80%	
2025年8月	2,800	40	660	-2.20%	23.60%	地盤改良工事の追加等により実行予算が大幅に増額した (+400M)
2025年9月	2,800	140	800	5.00%	28.60%	
2025年10月	2,800	150	950	5.30%	33.90%	
2025年11月	2,800	180	1,130	6.50%	40.40%	
2025年12月	2,800	670	1,800	23.90%	64.30%	大規模な鉄骨建方工事が完了し、外注先への支払いが検収・計上されたため、月次の原価発生が大幅に増加した (+380M)
2026年1月	2,800	150	1,950	5.30%	69.60%	
2026年2月	2,800	200	2,150	7.20%	76.80%	
2026年3月	2,800	150	2,300	5.30%	82.10%	(期末時点)

2. 進行基準適用案件毎の進捗率の算定根拠資料

- <進捗率の根拠資料例：進捗率を実際発生原価÷実行予算金額で算定している場合>
- ・ 進捗率の分母⇒実行予算書（進捗率算定における予算金額と整合するもの）、予算変更がある場合は当該変更に関する社内稟議書・承認証跡等
 - ・ 進捗率の分子⇒原価明細（進捗率算定における発生原価と整合するもの）

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
9	工事案件の収益認識の会計基準へのあてはめ	売上、売上原価	25/4月-26/3月	工事進行基準、未成工事の不正	別途親会社が指定する会社	5-1 工事進行基準の適用可否を取引ごとに判断しているか
10	工事案件の実行予算の月次推移分析					5-2 実行予算を適切に見積ることができるか
11	工事案件の購買データや原材料入出庫データの整合性分析					5-3 実際発生原価（材料費）は、購買データ及び原材料入出庫データと紐づいているか
12	工事案件の進捗率の月次推移分析					5-5 進捗率の算定根拠資料は適切に整備されているか
13	未成工事支出金の滞留チェック		26/3末			5-4 実際発生原価（経費）は、適切な根拠資料に基づき計上されているか 5-6 未成工事残高に長期滞留している案件がないか

● (No.13) 未成工事支出金の滞留チェック

① 確認方法（作業イメージ）

1. 期末の未成工事支出金明細を出力し、明細の合計と試算表の残高が一致していることを確かめる
2. 未成工事支出金明細のうち、発生日から起算して1年以上滞留しているものについて滞留要因と根拠証憑を確認し、合理的な理由がなく滞留している未成工事支出金については、売上原価が繰延られていないか否かを検討する
3. 1年以上滞留している未成工事支出金を一覧化し、滞留要因、初回原価発生日、売上原価への振替予定日を記載したリスト（滞留未成工事支出金一覧）を作成する

成果物イメージ
は次ページ参照

② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 滞留未成工事支出金一覧（滞留要因、初回原価発生日、売上原価への振替予定日を記載したもの）

2. 各実施項目の説明 – 販管費



<No.13 成果物イメージ>

● (No.13) 未成工事支出金の滞留チェック

1. 滞留未成工事支出金一覧（滞留要因、初回原価発生日、売上原価への振替予定日を記載したもの）

案件/管理 No.	案件名	期末残高 (百万円)	初回原価発生日	滞留期間(ヶ月)	滞留要因	売上原価への 振替予定日
PJ-24-001	A地区第一種市街地再開発事業	850	2024/6/15	21	工事期間5年の長期大規模プロジェクトのため、現時点での滞留は当初計画通り	2029年3月
C-24-105	B商業ビルリニューアル工事	120	2024/9/1	19	施主都合で一時中断していたが、工事再開が正式に決定。施主との間で工事再開時期と工程に関する合意書を締結済み	2027年3月
F-24-210	C製作所クリーンルーム設置	45	2024/11/20	16	顧客側の生産ラインの都合により、検収時期を延期する旨の依頼があり、双方合意済み	2026年6月
DEV-24-003	次世代エネルギー実証プラント開発	78	2024/7/10	20	複数年にわたる研究開発プロジェクトであり、現在はフェーズ2の実証実験段階。プロジェクト計画書通りに進捗中	2028年9月
PJ-25-008	D高速道路トンネル工事	210	2025/2/5	13	追加工事（工法変更）に関し、顧客との協議が完了し、増額分の費用を含む変更契約を締結済み。現在は変更契約に基づき工事を遂行中	2026年9月

<分析上のポイント> 滞留要因については、以下の観点で分析する

- ・ 顧客都合による滞留：仕様変更や現場への立ち入り制限など
- ・ 自社都合による滞留：品質問題による作業の長期化や社内承認プロセスによる遅延など
- ・ その他外的要因による滞留：行政からの許認可の遅延や資材供給停止、天災など

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
14	工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件の原価振替取引の要因説明	売上原価	25/4月-26/3月	赤字案件、部門間や工事案件等の原価付替	別途親会社が指定する会社	6-1 原価の振替・修正について、承認者・理由が記録・保存されているか
15	工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件の粗利率の月次推移分析					6-2 利益率がゼロに近い案件がないか

<自主点検実施項目No.14-15の手続対象会社：以下16社>

#	会社コード	会社名	#	会社コード	会社名
1	B07401	AW産業医療ガス	9	B53702	TOMCO2
2	B13401	AW東日本	10	B53705	TWA
3	B22301	AWエンジニアリング	11	B53706	AWGS
4	B24901	AW防災	12	B53901	パワーパートナーズ
5	B31201	AW西日本	13	B54001	日本電熱
6	B50301	アクアインテック	14	B54901	松尾HD
7	B52901	グローバルワイド	15	B55401	HITEC
8	B53201	メカトロニクス	16	B57801	ホクエイ



＜自主点検実施事項＞

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
14	工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件の原価振替取引の要因説明	売上原価	25/4月-26/3月	赤字案件、部門間や工事案件等の原価付替	別途親会社が指定する会社	6-1 原価の振替・修正について、承認者・理由が記録・保存されているか
15	工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件の粗利率の月次推移分析					6-2 利益率がゼロに近い案件がないか

●（No.14）工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件の原価振替取引の要因説明

① 確認方法（作業イメージ）

- 1. 工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件のうち、2026/3期年間（2025年4月～2026年3月）で売上原価が発生している案件について案件毎の原価明細を出力し、原価明細と該当案件の発生原価合計が一致していることを確かめる
- 2. 案件毎の原価明細において、マイナス処理の有無を確かめる。マイナス処理がある場合には、原価付替ではないかという観点からマイナス処理の合理的な理由を記載し、根拠証憑を整理する

② 親会社（AWI）に提出する成果物

- 1. 案件毎の原価明細上のマイナス取引について、取消となった理由（案件間の振替の場合はその理由）について記載したもの
- 2. 原価のマイナス取引の根拠証憑（承認証跡を含む。ただし、提出対象は請負高1億円以上の案件に限る）

成果物イメージは次ページ参照

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<No.14 成果物イメージ>

- (No.14) 工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件の原価振替取引の要因説明
1. 案件毎の原価明細上のマイナス取引について、取消となった理由（案件間の振替の場合はその理由）について記載したもの

PJT-001 PJT-002 PJT-003 + (工事案件毎にシートを分けて作成)

発生日	原価伝票No.	費目	品目名/摘要	金額	マイナス発生理由
2025/8/10	GEN-2508-015	材料費	鉄骨フレームA	5,000,000	
2025/8/20	GEN-2508-085	材料費	配線ケーブルC	-500,000	〔案件間振替〕 誤って当案件で計上したが、正しくは「PJT-002（B市民センター改修工事）」で使用した分であったため、案件間の原価振替を実施
2025/9/15	GEN-2509-050	外注費	基礎杭打工事	12,000,000	
2025/10/15	GEN-2510-041	材料費	特殊ガラスD	-300,000	〔仕入返品〕 納品されたガラスの一部に傷があり、品質基準を満たさなかったため、仕入先に返品処理を行った
2025/11/1	GEN-2511-005	経費	現場事務所賃借料	400,000	

2. 原価のマイナス取引の根拠証憑（承認証跡を含む。ただし、提出対象は請負高1億円以上の案件に限る）

<根拠資料の資料例>

案件間の原価振替：振替伝票、現物の移動伝票や作業員振替指示書、振替理由をサポートする文書（稟議書や報告書）

仕入返品・値引き：返品伝票、仕入先発行のクレジットノート/返金明細書、交渉記録（メールや議事録）

過大計上・誤入力の訂正：誤った計上傳票、正しい金額が記載された請求書や契約書、訂正の経緯が記録された文書（報告書や訂正依頼書）

<分析上のポイント>

- ・ 原価のマイナス計上は、原価付替リスクがあるため、合理的な理由と客観的な証跡の有無を確認する
- ・ 承認証跡は、伝票に残された承認印やサインやワークフローによる承認履歴、申請書・稟議書の承認印などで確認する

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
14	工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件の原価振替取引の要因説明	売上原価	25/4月-26/3月	赤字案件、部門間や工事案件等の原価付替	別途親会社が指定する会社	6-1 原価の振替・修正について、承認者・理由が記録・保存されているか
15	工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件の粗利率の月次推移分析					6-2 利益率がゼロに近い案件がないか

●（No.15）工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件の粗利率の月次推移分析

① 確認方法（作業イメージ）

1. 工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件のうち、2026/3期年間（2025年4月～2026年3月）で売上原価が発生している案件について、案件毎の利益率の月次推移を作成する
2. 案件毎の利益率の月次推移において、利益率が低い水準で、かつ変動が見られない案件がないかを確認する。該当案件について、他案件に振替えた原価がないかを調査し、調査結果を記載する

② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 案件毎の利益率の月次推移表（請負高1億円以上の案件で、利益率が5%を下回り、かつ一定期間変動が見られない案件については、他案件に振替えた原価の有無に関する調査結果とその根拠資料を提出する）

成果物イメージ
は次ページ参照

2. 各実施項目の説明 – 売上、売上原価関連



<No.15 成果物イメージ>

- (No.15) 工事案件及び工事以外の個別原価計算適用案件の粗利率の月次推移分析
 - 1. 案件毎の利益率の月次推移表（請負高1億円以上の案件で、利益率が5%を下回り、かつ一定期間変動が見られない案件については、他案件に振替えた原価の有無に関する調査結果とその根拠資料を提出する）

PJT-001 PJT-002 PJT-003 + (工事案件毎にシートを分けて作成)

年月	請負額 (百万円)	実行予算 (百万円)	実際発生原価 (累積) (百万円)	進捗率 (累積)	売上高 (累積) (百万円)	利益 (累積) (百万円)	利益率 (累積)	コメント
2025年4月	5,000	4,500	450	10.00%	500	50	10.00%	
2025年5月	5,000	4,500	900	20.00%	1,000	100	10.00%	
2025年6月	5,000	4,500	1,350	30.00%	1,500	150	10.00%	
2025年7月	5,000	4,500	1,800	40.00%	2,000	200	10.00%	
2025年8月	5,000	4,500	2,250	50.00%	2,500	250	10.00%	
2025年9月	5,000	4,500	2,700	60.00%	3,000	300	10.00%	
2025年10月	5,000	4,800	3,500	72.90%	3,646	146	4.00%	10月に判明した既存躯体の劣化に対し、構造安全性を確保するための追加補強工事が不可避であり、顧客との協議の結果、追加費用300Mは当社の負担となった
2025年11月	5,000	4,800	3,950	82.30%	4,115	165	4.00%	10月の利益率悪化は一過性のものであり、その後は予算通りに原価が発生した
2025年12月	5,000	4,800	4,200	87.50%	4,375	175	4.00%	
2026年1月	5,000	4,750	4,370	92.00%	4,600	230	5.00%	
2026年2月	5,000	4,750	4,560	96.00%	4,800	240	5.00%	
2026年3月	5,000	4,800	4,800	100.00%	5,000	200	4.00%	

<分析上のポイント> 定性分析または定量分析から付替えの有無を検証する

- **定性分析**：利益率悪化の理由を確認し、例えば、実行予算変更に伴うものであれば、変更稟議書等を根拠資料として確認する。また利益率の悪化トレンドの中で利益率を維持できている期間については、利益率を維持できている理由を記載する
- **定量分析**：残工事予算と実績の突合により検証する。本ケースにおいては10月末時点の残予算がその後の工事で当案件の原価として計上されていることを確認する。具体的には残工事予算の内訳と、11月～3月の原価明細を突合し、重要な費目について予算と実績に乖離がないことを確認する

2. 各実施項目の説明 – 販管費



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
18	各費用の月次推移分析	販管費	25/4月-26/3月	費用の前倒し・後倒し 仮払金、長期前払費用、 その他資産勘定を使った 費用の繰延	全社	8-1 決算期に特定の値引・費用が集中していないか
19	当期に費用計上すべき請求書の有無のチェック		26/4月単月			8-2 2026年3月期に計上すべき費用が翌期の計上と なっていないか
20	非経常的な事象の確認		25/4月-26/3月			8-3 非経常的な取引について、2026年3月期の会計 処理が検討するために各部署から情報を収集しているか
21	見積計上費用の計上根拠整理		26/3月単月			8-4 見積計上している費用の根拠を確認したか

●（No.18）各費用の月次推移分析

① 確認方法（作業イメージ）

1. 2026/3期年間（2025年4月～2026年3月）の販管費において、残高試算表の月次推移を作成し、2026年3月に著しい増加があった場合には要因をコメントし、根拠資料を整理する

② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 販管費の月次推移データ（推移をグラフ化し、2026年3月に著しい増加があった場合に分析コメントを付したもの。当該分析結果の根拠資料を提出する）

成果物イメージ
は次ページ参照

<No.18 成果物イメージ>

- (No.18) 各費用の月次推移分析
 - 1. 販管費の月次推移データ（推移をグラフ化し、分析コメントを付したもの。当該分析結果の根拠資料を提出する）



- <分析上のポイント>
- ・ 要因コメントには要因毎の影響金額を記載する
 - ・ 著しいかどうかの判断においては、金額の大きさ（絶対額）と平均からの乖離率（変化率）の両方の観点で分析する
 - ・ 科目ごとの特性を考慮して分析する
 - 固定的な費用：地代家賃、リース料など
 - 変動的な費用：広告宣伝費、旅費交通費など
 - 決算特融の費用：販売促進費など

(単位：千円)																
勘定科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計	月次平均	3月増減率 (vs 平均)	要因コメント
地代家賃	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	2,000	0%	
広告宣伝費	1,500	2,000	1,800	2,100	1,600	2,400	1,900	2,300	3,000	1,600	2,200	20,000	42,400	3,533	466%	期末商戦に向けた大規模Webキャンペーン費用（+16,000）
販売促進費	3,000	2,500	2,800	3,100	2,600	3,500	3,000	3,300	5,000	2,500	3,200	15,000	52,500	4,375	243%	主要販売代理店に対する年間販売目標達成に伴う販売奨励金（リベート）の支払い（+10,000）
支払手数料	1,000	1,200	1,100	1,100	1,000	1,300	1,200	1,400	1,500	1,100	1,500	-10,000	3,400	283	-3634%	主要サプライヤーとの年間仕入目標達成に伴う仕入割戻（リベート）の受領（-12,000）
旅費交通費	1,000	900	1,100	1,000	800	1,300	1,100	1,300	900	1,100	1,200	1,200	13,800	1,150	4%	

2. 各実施項目の説明 – 販管費



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
18	各費用の月次推移分析	販管費	25/4月-26/3月	費用の前倒し・後倒し 仮払金、長期前払費用、 その他資産勘定を使った 費用の繰延	全社	8-1 決算期に特定の値引・費用が集中していないか
19	当期に費用計上すべき請求書の有無のチェック		26/4月単月(※)			8-2 2026年3月期に計上すべき費用が翌期の計上と なっていないか
20	非経常的な事象の確認		25/4月-26/3月			8-3 非経常的な取引について、2026年3月期の会計 処理が検討するために各部署から情報を収集しているか
21	見積計上費用の計上根拠整理		26/3月単月			8-4 見積計上している費用の根拠を確認したか

● (No.19) 当期に費用計上すべき請求書の有無のチェック

① 確認方法（作業イメージ）

- 2026年4月に費用計上された仕訳の明細データを出力し、明細データの合計と試算表の金額が一致することを確認する
- 仕訳明細データの摘要欄等から、2026年3月に計上すべき費用の有無を確認する
- 2026年4月に受領した請求書から、2026年3月分として計上すべき取引がないかを確認する
- 2026年3月分として計上すべき費用について、根拠資料を整理し、会計処理の顛末を記載する

② 親会社（AWI）に提出する成果物

- 2026年4月に費用計上された仕訳データ一覧（2026年3月分として計上すべき費用については会計処理の顛末を記載し、根拠資料を提出する）

※2026年4月のデータチェックは5月以降に実施した上で成果物を提出する

成果物イメージ
は次ページ参照

2. 各実施項目の説明 – 販管費



<No.19 成果物イメージ>

● (No.19) 当期に費用計上すべき請求書の有無のチェック

1. 2026年4月に費用計上された仕訳データ一覧（2026年3月分として計上すべき費用については会計処理の顛末を記載し、根拠資料を提出する）

仕訳伝票No.	発生日	勘定科目	摘要	金額	3月に計上すべき費用か	会計処理の顛末	修正した場合は伝票Noを記載
J-2604-0115	2026/4/5	地代家賃	4月分事務所賃料	1,000,000	×		
J-2604-0238	2026/4/10	広告宣伝費	3月実施Web広告費	3,000,000	○	請求書の到着が4月になったため、担当部署が未払計上を失念。本来は26年3月期に未払費用として計上すべき取引であったため修正仕訳を起票	SL2604-0312
J-2604-0301	2026/4/15	消耗品費	事務用品購入	150,000	○	担当部署が計上を失念していたため、4月に計上。但し、金額的な重要性が低いため修正は行わない	
J-2604-0555	2026/4/25	業務委託費	事業戦略レポート作成	5,000,000	○	成果物の納品・検収が3月28日に完了していたが、経理への費用計上依頼が遅延。本来は26年3月期に未払費用として計上すべき取引であったため修正仕訳を起票	SL2604-0315
J-2604-0890	2026/4/30	旅費交通費	大阪出張（4/20～4/21）	80,000	×		

<分析上のポイント>

- ・ 各仕訳の証憑（請求書・納品書など）を確認し、2026年3月以前に計上すべきでないか（費用を計上すべき実際の日付）を検証する

2. 各実施項目の説明 – 販管費



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
18	各費用の月次推移分析	販管費	25/4月-26/3月	費用の前倒し・後倒し 仮払金、長期前払費用、 その他資産勘定を使った 費用の繰延	全社	8-1 決算期に特定の値引・費用が集中していないか
19	当期に費用計上すべき請求書の有無のチェック		26/4月単月			8-2 2026年3月期に計上すべき費用が翌期の計上と なっていないか
20	非経常的な事象の確認		25/4月-26/3月			8-3 非経常的な取引について、2026年3月期の会計 処理が検討するために各部署から情報を収集しているか
21	見積計上費用の計上根拠整理		26/3月単月			8-4 見積計上している費用の根拠を確認したか

●（No.20）非経常的な事象の確認

① 確認方法（作業イメージ）

1. 2026年3月期の会計処理を検討するため、管理部門により非経常的な取引について各部署から情報を収集しているか、またどのような手段で収集しているかを確認する
2. 収集した情報を基に、管理部門が会計処理を検討したことを確認する

② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 2026年3月期において管理部門が非経常的な取引について情報収集したことが分かる資料
（メールや書面により各部署から情報を収集しているアンケート等）
2. 収集した情報を基に、管理部門が会計処理を検討したことがわかる資料

2. 各実施項目の説明 – 販管費



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
18	各費用の月次推移分析	販管費	25/4月-26/3月	費用の前倒し・後倒し 仮払金、長期前払費用、 その他資産勘定を使った 費用の繰延	全社	8-1 決算期に特定の値引・費用が集中していないか
19	当期に費用計上すべき請求書の有無のチェック		26/4月単月			8-2 2026年3月期に計上すべき費用が翌期の計上と なっていないか
20	非経常的な事象の確認		25/4月-26/3月			8-3 非経常的な取引について、2026年3月期の会計 処理が検討するために各部署から情報を収集しているか
21	見積計上費用の計上根拠整理		26/3月単月			8-4 見積計上している費用の根拠を確認したか

●（No.21）見積計上費用の計上根拠整理

① 確認方法（作業イメージ）

1. 2026年3月の仕訳データを出力し、見積計上された費用リストを作成する
2. 見積費用は、根拠に従い適切に計上されていることを確認し、根拠資料を整理する

② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 2026年3月 見積計上費用リスト（会計処理の顛末を記載し、根拠資料を提出する）

成果物イメージ
は次ページ参照

2. 各実施項目の説明 – 販管費



<No.21 成果物イメージ>

● (No.21) 見積計上費用の計上根拠整理

1. 2026年3月 見積計上費用リスト（会計処理の顛末を記載し、根拠資料を提出する）

仕訳伝票No.	勘定科目	見積費用の根拠	3月末 見積計上額	会計処理の顛末	修正した場合は 伝票Noを記載
J-2509-1234	支払手数料	年間保守契約書	5,000,000	契約書に基づき計上。実績と一致	
J-2512-5678	広告宣伝費	前年同月のキャンペーン実績	10,000,000	見積過少。追加出稿分の報告漏れにより、差額は4月費用として処理	J-2604-0311
J-2512-9012	修繕費	業者からの概算見積書	8,000,000	安全を見込んだ保守的見積り。差額200万円は4月度に費用戻入益として処理	J-2604-0313
J-2603-3456	支払手数料	顧問弁護士からの費用見込額メール	20,000,000	見積過少。期末の緊急相談による超過分（200万円）を4月費用として処理	J-2604-0314
J-2603-7890	採用教育費	イベント会社からの正式な見積書	12,000,000	見積過大。会場費の値引き交渉成功による差額500万円を4月費用から減額	J-2604-0322

<分析上のポイント>

- ・ 見積費用の根拠は、可能な限り信頼性のある資料（契約書や正式な見積書など）に基づいて算出していることを確認する

2. 各実施項目の説明 – 固定資産



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
22	固定資産の除却取引のチェック	固定資産	25/4月-26/3月	固定資産の除却損漏れ	全社	9-1 当期に実施した除却について、証票に基づき適切な処理がされているか
23	修繕費・研究費に基づく資産計上項目のチェック		26/3末	資産性のない支出の固定資産計上		9-2 修繕費や研究費などの費用を資産化しているものはないか

●（No.22）固定資産の除却取引のチェック

① 確認方法（作業イメージ）

1. 2026年3月期年間の総勘定元帳より当期の除却取引を抽出し、合計額と試算表との一致を確かめる
2. 当期に実施した除却について、適切な根拠に基づき会計処理が行われていることを確かめる

② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 総勘定元帳より、当期の除却の取引を抽出し、根拠資料とともに提出する

成果物イメージ
は次ページ参照

2. 各実施項目の説明 – 固定資産



<No.22 成果物イメージ>

● (No.22) 固定資産の除却取引のチェック

1. 総勘定元帳より、当期の除却の取引を抽出し、根拠資料とともに提出する

資料源泉：総勘定元帳

単位：百万円

No.	伝票No.	日付	勘定科目名	相手科目名	貸方金額	摘要	コメント
1	10001	2025/4/14	工具器具備品	減価償却累計額	100	固定資産除却 資産廃棄	製品の販売終了に伴い、利用不可となったため除却したものである。 2025/4/14付の除却申請書および廃棄証明書にて、上長や管理部門の承認がある こと、および適切な根拠に基づき除却されていることを確かめた。
2	10002	2025/7/25	機械装置	減価償却累計額	100	固定資産除却 資産廃棄	災害に伴い、修復不可能であるため除却したものである。 2025/7/25付の除却申請書および廃棄証明書にて、上長や管理部門の承認がある こと、および適切な根拠に基づき除却されていることを確かめた。
合計					200		
試算表上の金額					200		
差異					0		

<根拠資料の資料例>

- ・ 除却申請書
- ・ 廃棄証明書や廃棄リスト

<チェックのポイント>

- ・ 根拠資料にて、適切な承認者の承認証跡を確かめる。
- ・ 除却日付や金額について、総勘定元帳との整合性を確かめる。

2. 各実施項目の説明 – 固定資産



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
22	固定資産の除却取引のチェック	固定資産	25/4月-26/3月	固定資産の除却損漏れ	全社	9-1 当期に実施した除却について、証票に基づき適切な処理がされているか
23	修繕費・研究費に基づく資産計上項目のチェック		26/3末	資産性のない支出の固定資産計上		9-2 修繕費や研究費などの費用を資産化しているものはないか

● (No.23) 修繕費・研究費に基づく資産計上項目のチェック

① 確認方法（作業イメージ）

1. 2026年3月期末の固定資産台帳を出力し、台帳の金額合計が試算表の固定資産残高と一致していることを確かめる
2. 固定資産台帳のうち、修繕費や研究費を資産計上している明細を名称等から抽出し、資産計上について会計基準にしたがった検討を行った上で計上されているかを確かめる

② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 修繕費及び研究費に基づく資産計上項目について、固定資産台帳でフラグ付けを行った上で、根拠資料を提出する

成果物イメージ
は次ページ参照

<No.23 成果物イメージ>

- (No.23) 修繕費・研究費に基づく資産計上項目のチェック
 - 1. 修繕費及び研究費に基づく資産計上項目について、固定資産台帳でフラグ付けを行った上で、根拠資料を提出する

<修繕費等の固定資産に関する支出の資産計上判断基準（例）> 法人税法通達7-8-1、7-8-2参照
耐用年数の延長、価値の増加→資産計上（以下、具体例）

- ・ 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
- ・ 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

本来の機能の維持→費用処理（以下、具体例）

- ・ 建物の移えい又は解体移築をした場合におけるその移えい又は移築に要した費用の額
- ・ 機械装置の移設に要した費用（解体費を含む。）の額

<根拠資料の資料例（修繕費）>

- ・ 取引の目的や内容が記載された見積書や仕様書等
- ・ 取引の金額が記載された請求書
- ・ 社内での意思決定資料（稟議書等）

<研究費の資産計上判断基準> 研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針11参照
将来の収益獲得又は費用削減が確実と認められる場合→資産計上（以下、具体例）

- ・ 自社で利用するためにソフトウェアを制作し、当初意図した用途に継続して利用することにより、当該ソフトウェアを利用する前と比較して会社の業務を効率的又は効果的に遂行できると明確に認められる場合
- ・ より具体的には、当該ソフトウェアを利用することにより、利用する前と比べ間接人員の削減による人件費の削減効果が確実に見込まれる場合、複数業務を統合するシステムを採用することにより入力業務等の効率化が図れる場合等

確実であると認められない場合又は確実であるかどうか不明な場合→費用処理

<根拠資料の資料例（研究費）>

- ・ 研究以前と以後で費用削減や収益獲得の検討結果が記載された稟議書等
- ・ 取引の金額が記載された請求書
- ・ 作業完了報告書、最終テスト報告書等

固定資産台帳							追記箇所	
資産名	資産勘定科目名	取得日付	取得価額	期首帳簿価額	当期償却額	期末帳簿価額	研究費、修繕費フラグ	コメント
本社	建物	2025/4/14	500	400	20	380	修繕費	承認済みの稟議書、見積書にて建物の避難階段の取付を行った際の費用であることを確認し、資産の価値の増加と判断できるため資産計上している。また、請求書にて取得価額との一致を確認した。
商品情報システムバージョンアップ	ソフトウェア	2026/1/25	60	40	5	35	研究費	承認済みの稟議書にて、当該バージョンアップにより年間200百万円の費用削減が見込まれており、将来の費用削減が確実であると判断したため、資産計上している。また、最終テスト報告書にて、2026/1/23に作業が完了していることを確認した。さらに、請求書にて取得価額の一致を確認した。
合計					25	415		
試算表上の金額					25	415		
差異					0	0		

単位：百万円

2. 各実施項目の説明 – 固定資産



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
25	減損判定資料の作成及び提出	固定資産	26/3末	減損損失の先送り・計上漏れ（のれん含む）	全社	9-4 減損兆候の有無を検討したか

●（No.25）減損判定資料の作成及び提出

① 確認方法（作業イメージ）

1. 2026年3月末時点で少なくとも日本基準の減損の兆候に抵触したCGUについて、割引後の将来キャッシュフローの算定を行った上で減損判定を行っているか（日本基準で不要な場合でも、IFRS基準で減損損失の計上が必要な場合に備えて資料を作成しているか）
2. 行っていない場合、減損判定を行う

② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 各CGUの減損判定資料
2. 割引前将来キャッシュフロー及び割引後将来キャッシュフローの算定資料

成果物イメージ
は次ページ参照

2. 各実施項目の説明 – 固定資産



<No.25 成果物イメージ>

● (No.25) 減損判定資料の作成及び提出

1. 各CGUの減損判定資料(成果物イメージの1,2)

2. 割引前将来キャッシュフロー及び割引後将来キャッシュフローの算定資料(成果物イメージの3-5)

<成果物イメージ>

1.資産のグルーピング

資産のグルーピングは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行う。(減損会計基準 二 6.(1)参照)
実務的には、管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の単位等を考慮してグルーピングの方法を定めることになると考えられる。(減損会計意見書 四 2.(6)①参照)
当社は～のため、グループaとグループbを「他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位」としている。

2.兆候判定

単位：百万円(以降同様)

グルーピング単位	営業損益又はCF 2025年3月期	営業損益又はCF 2026年3月期	1.営業活動に係 る損益又はCF	2.回収可能価額を 著しく低下させる変化	3.経営環境の 著しい悪化	4.固定資産の市場 価格の著しい下落	減損の兆候
グループa	100	150	兆候なし	該当なし	該当なし	該当なし	兆候なし
グループb	-100	-200	兆候あり	該当なし	該当なし	該当なし	兆候あり

3.割引前将来CFと帳簿価額の比較(日本基準)

グループbについて兆候ありのため認識の判定を行う
なお、対象の固定資産の残存耐用年数は3年程度である。

帳簿価額	100
割引前将来CF	105
減損認識	減損を認識しない

資料源泉：事業計画

	FY27	FY28	FY29
将来CF	-60	75	90

4.回収可能価額と帳簿価額の比較(IFRS)

3.にて認識しないとの結論になったものの、IFRSに照らし、回収可能価額との比較を行う。

帳簿価額	100
回収可能価額	99
減損認識	減損を認識

割引率	1.7
-----	-----

<回収可能価額算定>

使用価値	99	⇒回収可能価額
公正価値	70	

5.回収可能価額と帳簿価額の比較(IFRS)

科目	期末簿価	回収可能価額	減損損失計上額
工具器具備品	60	59.5	0.5
機械装置	40	39.5	0.5


<日本基準とIFRSの差異>

認識判定における、割引前CFと帳簿価額の比較はIFRSでは規定されていない。そのため、割引前CF>帳簿価額であっても、回収可能価額(割引後CF)と帳簿価額の比較をする必要がある(フローチャートの赤字部分)

<減損判定のフローチャート>

兆候判定（日本基準）

- 営業活動から生ずる損益、CFが継続してマイナス
- 回収可能価額を著しく低下させる変化がある(例:遊休資産、長期滞留建設仮勘定等)
- 経営環境の著しい悪化
- 市場価格の著しい下落

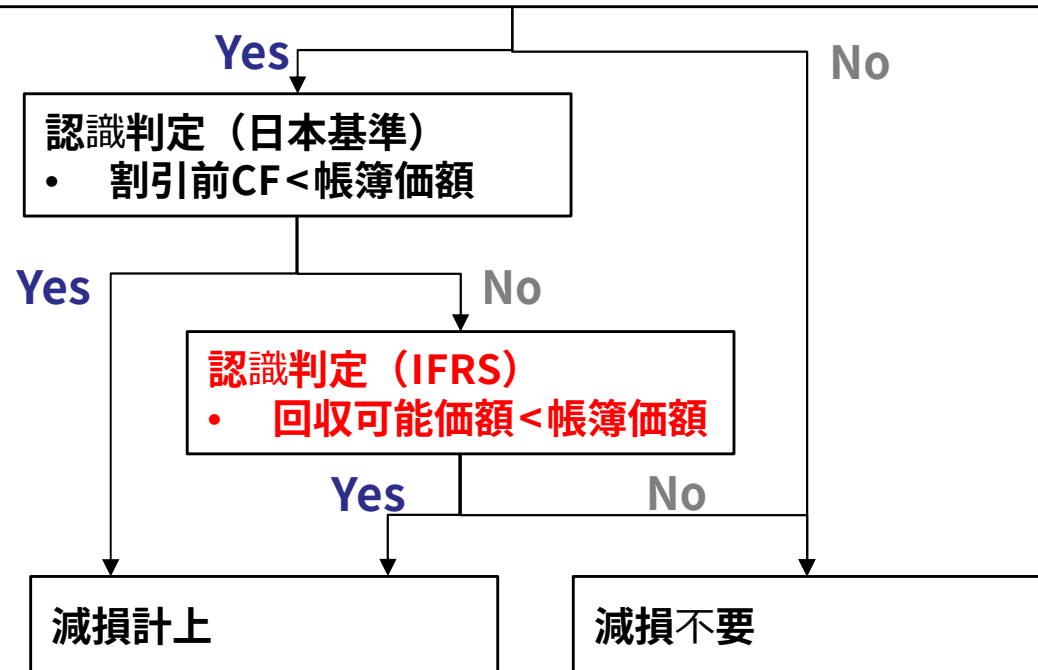

2. 各実施項目の説明 – 引当金



<自主点検実施事項>

No.	自主点検項目	関連科目	対象期間	対応論点項目	対象会社	チェック項目（チェックリスト）
26	賞与引当金の計上根拠資料、支払額比較	引当金	25/4月-26/3月	賞与引当金の計上時期操作	全社	10-1 賞与引当金が適切な時期に計上されているか 10-2 賞与引当金が計上されている場合、見積金額は根拠が明確であるか 10-3 賞与引当金が計上されていない場合、根拠が明確であるか

●（No.26）賞与引当金の計上根拠資料、支払額比較

① 確認方法（作業イメージ）

1. 2026年3月期年間の賞与引当金繰入額および賞与引当金残高の月次推移表を作成する
2. 賞与引当金の計上起票及び取り崩し起票について、根拠に基づいた計上が行われているかを確認
3. 賞与引当金が計上されていない企業は、計上不要と判断した理由をコメントする

② 親会社（AWI）に提出する成果物

1. 計上根拠資料
2. 取り崩し時の支払証跡及び当初計上額と支払額の比較分析
3. 賞与引当金を計上していない企業は、計上不要とした理由を記載する

成果物イメージ
は次ページ参照

2. 各実施項目の説明 - 引当金



<No.26 成果物イメージ>

- (No.26) 賞与引当金の計上根拠資料、支払額比較
 - 1. 計上根拠資料
 - 2. 取り崩し時の支払証跡及び当初計上額と支払額の比較分析
 - 3. 賞与引当金を計上していない企業は、計上不要とした理由を記載する

資料源泉：月次推移表、支払証跡

単位：百万円

対象年月	賞与引当金繰入額	①賞与引当金	②支払額	③計上額-支払額 (①-②)	差異の主な要因
2025年4月	100	100	-	-	
2025年5月	100	200	-	-	
2025年6月	100	300	-	-	
2025年7月	100	400	-	-	
2025年8月	100	500	-	-	
2025年9月	100	600	400	200	2025年8月の大量退職に伴い、賞与支給対象人数が100名減少したため
2025年10月	120	120	-	-	
2025年11月	120	240	-	-	
2025年12月	120	360	-	-	
2026年1月	120	480	-	-	
2026年2月	120	600	-	-	
2026年3月	120	720	750	-30	大型案件の増加等による業績好調に伴い、一人当たり支給日数が0.2か月増加したため

<分析上のポイント>

- ・ 引当金計上額と支払額に乖離がある場合は要因をコメントする。
- ・ 支払証跡を整理する。（提出が要請される場合がある）
- ・ 賞与引当金が計上不要となる場合例えば以下のようなコメントを記載する。
 - ・ 賞与制度がない
 - ・ 賞与は会社の業績によって決定されるものであり、支給の有無を見積もることが困難であった 等

2. 各実施項目の説明 – 財務分析



<自主点検実施事項>

● (No.28) 財務分析 (4/10時点 ※一部変更の可能性あり)

目的	- 自主点検として、3Qおよび期末の決算の妥当性の総点検 - 説明のつかない異常な勘定科目の増減の有無などを確認
対象期間	(3Q) PL : 前期3Qとの比較、BS : 前期末との比較 (期末) PL : 前期4Qとの比較、BS : 前期末との比較 ※分析結果次第で、それ以前の事業年度も分析対象となる場合あり
分析対象会社	- 連結PKG上での分析 (AW親会社に提出しているもの) : 全社 - 個社別の分析 : リスク評価に基づき、約80社を対象
分析手続き	- 連結PKG上での分析 : 連結PKG上の増減分析を実施、監査法人からの質疑応答あり - 個社別の分析 (約80社) : 分析対象会社には別途手続きをご案内 (各サポートチームで対象各社ごとに分析ファイルを準備します。当該ファイルで手続きの詳細を記載します)
留意点	- 個社別の分析 (約80社) 対象会社は、連結PKG上での分析と、サポートチームにて準備する分析用ファイルの2点が併存する形となります (分析の基準値等が異なります)。監査法人との質疑応答に関しては、後者の分析用ファイルを中心に財務分析を進めることになります - 個社別の分析 (約80社) の対象会社や範囲、基準値などはリスク評価や分析状況を踏まえて、適宜変更される可能性があります (変更が生じた場合は各社ごとに作成する分析用ファイルに適宜反映)

デロイトサポート統括チーム

<pj_angel_subsidary-support-headquarters@tohmatu.co.jp>
